



✗ Gemeente
✗ Amsterdam
✗



 van gelder



Stap 1 – Afzetten rij parkeervakken (weg en water blijven open)



Stap 2 – Opvullen eventueel aanwezige holle ruimtes onder de bestaande kadeconstructie



Stap 3 – verwijderen bovenste halve meter van de kademuur



Stap 4 – aanbrengen stalen buispalen met diameter 500 mm, h.o.h. 750 mm




Stap 5 – aanbrengen kleine, korte buispalen met diameter 273 mm, tussen de grote in



Stap 6 – aanbrengen ankerbinding (met ankerstoelen)




Stap 7 – aanbrengen ankers, h.o.h. 4,50 m (komt bij lage kades te vervallen)

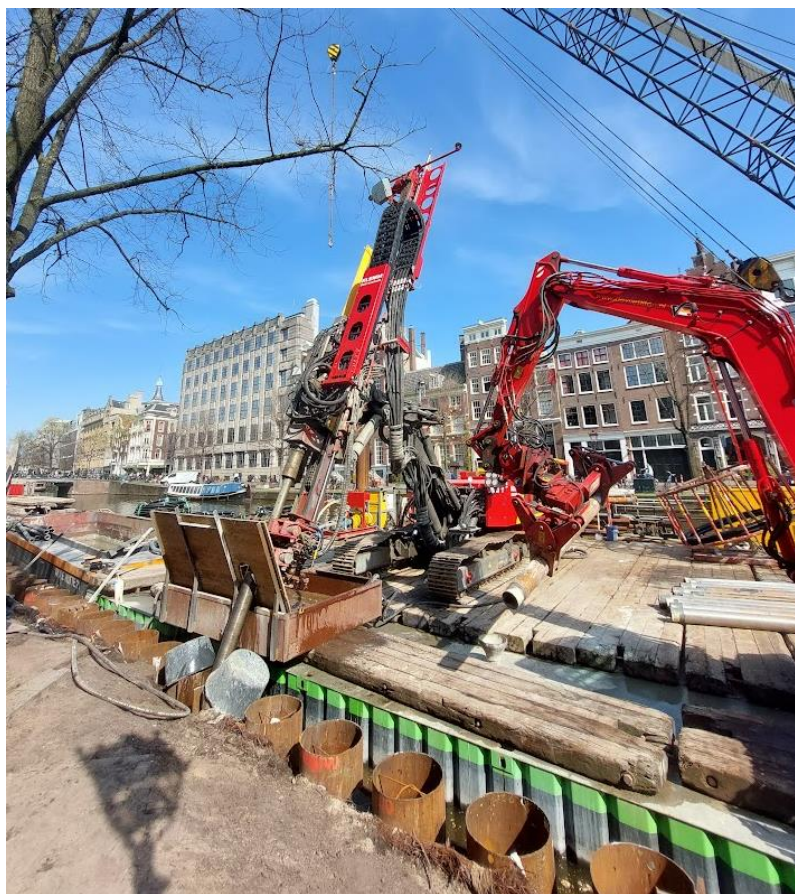


Stap 8 – verwijderen voorste deel bestaande kademuur



Stap 9 – Aanbrengen prefab betonnen bekledingselementen, voorzien van metselwerk

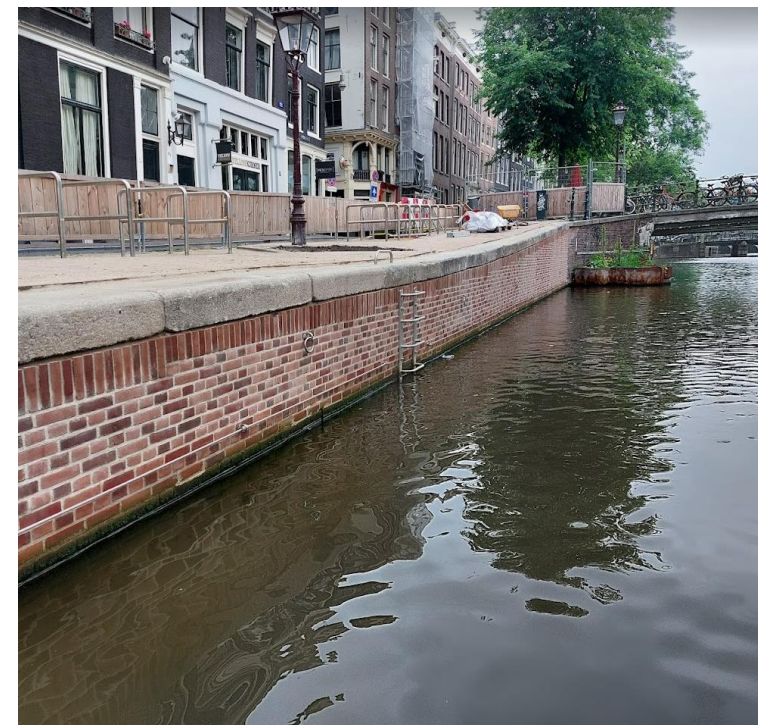

Stap 10 – Aanbrengen deksteen en overige verhardingen + vrijgave parkeerstrook

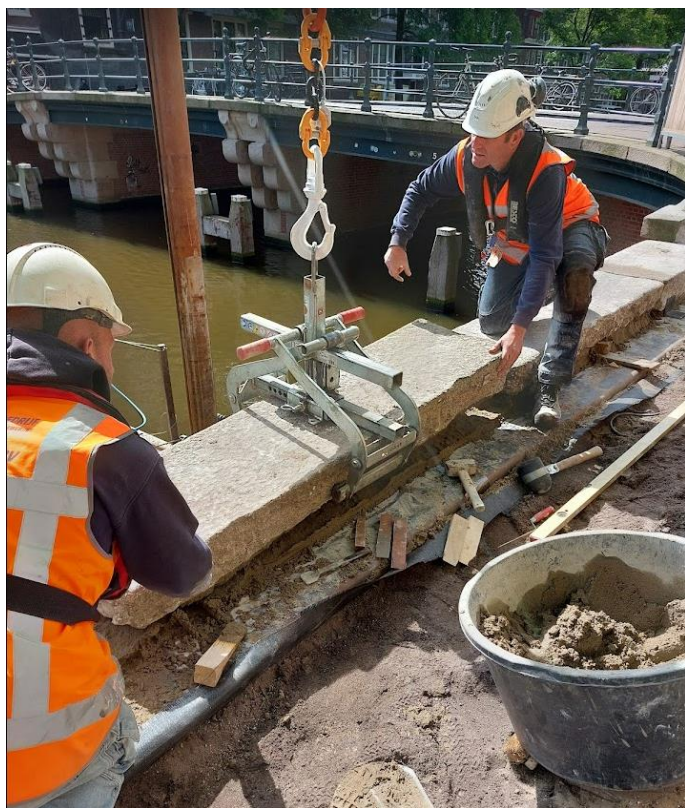

Stap 11 – Kademuur gereed

Realisatie pilot in 8 maanden!

